

施政計畫管理平台

「標案管理」填報說明

國際發展及計畫處-企劃研考科

113.12.5

1

➤ 哪些計畫必須作「標案管理」？

 **每項計畫**均須新增標案(原則)


1. 花東基金補助計畫---楊芮涵
2. 離島基金補助計畫---吳明謹
3. 前瞻基礎建設計畫---吳明謹
4. 基本設施補助計畫---陳慧娟
5. 縣預算三大專案計畫---陳慧娟
 - 延續型計畫
 - 新增型計畫
 - 專案型計畫
6. 以上計畫外之中央補助與縣預算支應之發包案件---林定

➤ 何時需「新增標案」？

- 簽辦採購招標文件時
- 請於採購招標的簽文註記「標案編號」
- 無需加會國計處，經費核銷時如無標案編號，將會被主計處退件！所以請主動配合新增標案！
- 114年度之計畫預計1月底前完成審核，請留意新增計畫之通報，計畫建置並經國計處審核完成才能新增標案；如已完成招標文件簽文，屆時須補建置標案

標案編號就是通行碼

➤ 落實計畫經費管理

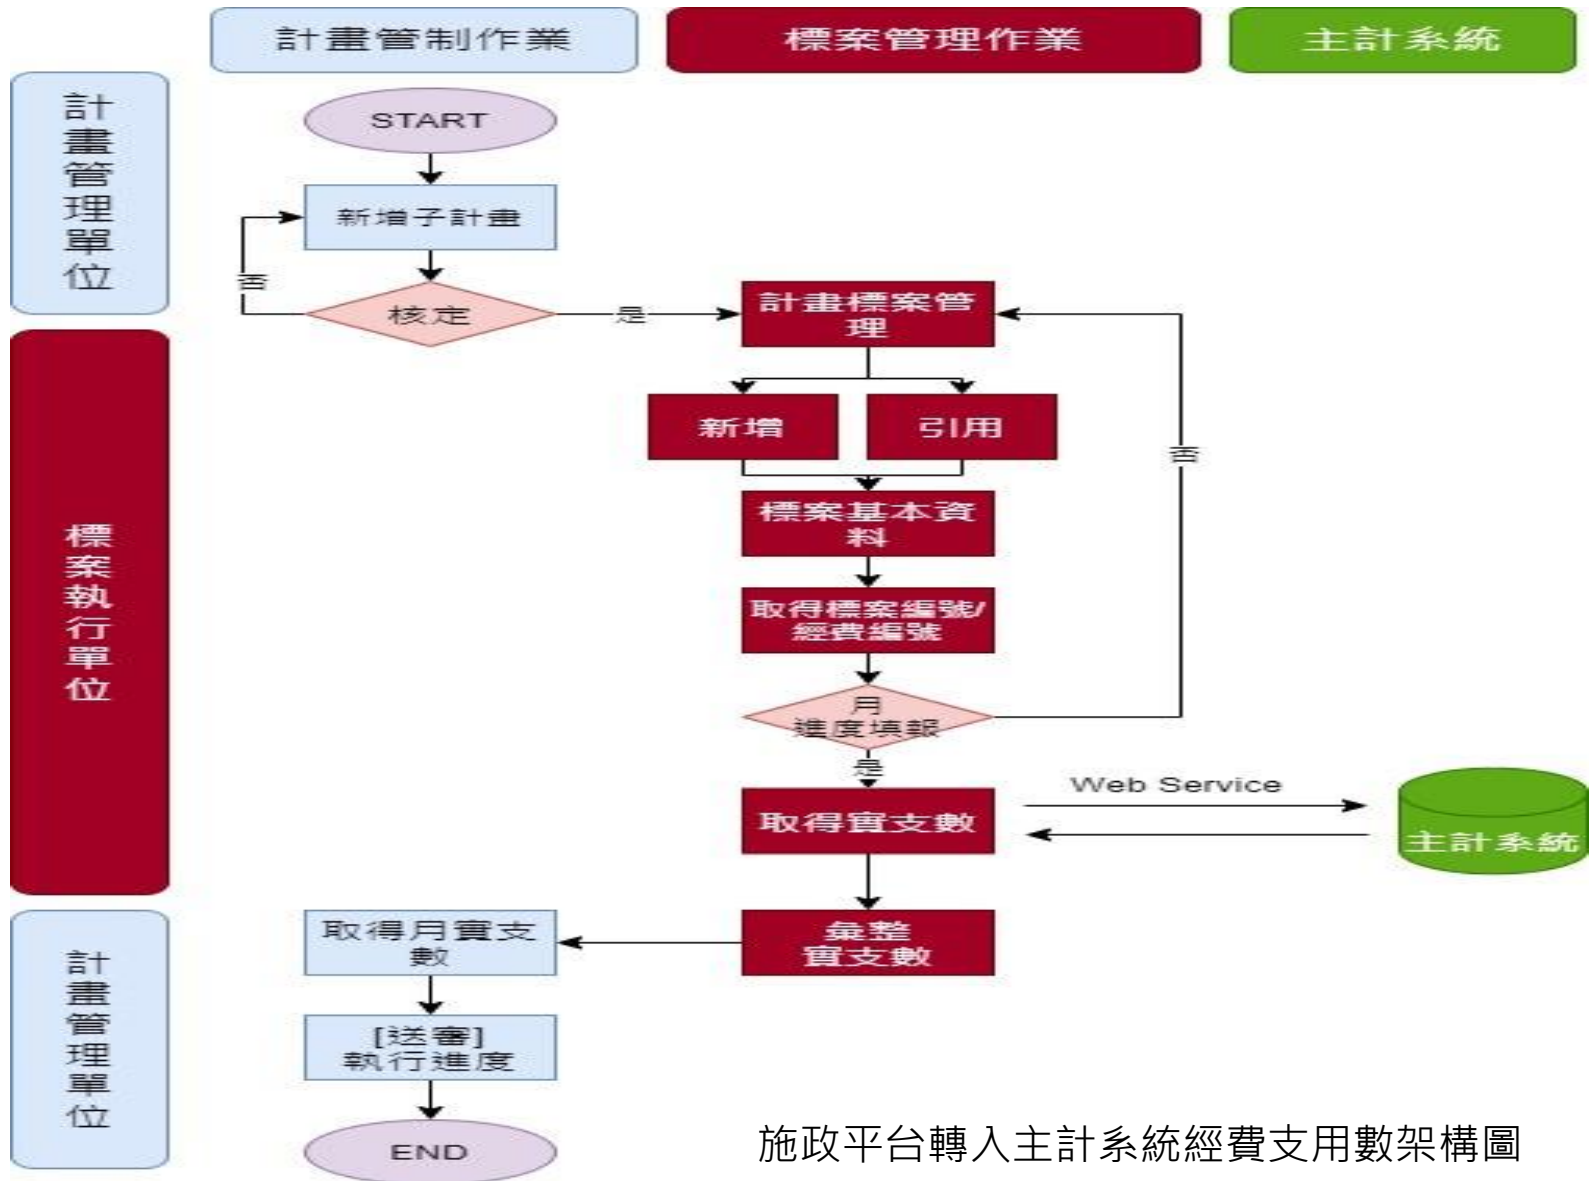

施政平台轉入主計系統經費支用數架構圖

標案填報說明



5

一、填報路徑

施政管理平台



標案管理系統



標案管理作業



計畫標案管理

[系統操作手冊](#)

[期程調整步驟說明](#)

[提案管理系統](#)

[計畫管制系統](#)

[標案管理系統](#)

[標案管理系統](#)

[標案管理作業](#)

[計畫標案管理](#)

[首長交辦系統](#)

[議會管理系統](#)

[風險管理系統](#)

[問題反應回報系統](#)

[系統工具](#)

台東縣政府 施政計畫管理整合作業平台

系統功能列表

計畫標案管理

查詢狀態

查詢

新增

匯出

年度：請選擇

標案編號：

標案名稱：

承辦處別：國際發展及計畫處

承辦科別：企劃研考科

承辦人：江幸娟

標案列表

年度 標案編號 標案名稱 計畫名稱 承辦處別 承辦科別 承辦人 計畫期程(起) 計畫期程(迄) 標案類別 主計系統

無資料顯示...

二、選計畫

計畫標案管理

新增標案

選取子計畫

填入標案資料

儲存

系統功能列表 計畫標案管理

新增狀態 儲存 離開

子計畫 :		1 選取
子計畫序號 :		
計畫期程(起) :		計畫期程(迄) :
計畫總經費 :		計畫可用經費(含標案金額) :
# : [計畫可用經費]內已包含[本標案金額],[標案金額]不得超過[計畫總經費]		
標案年度 :	<input type="text"/>	產生期程 <input type="checkbox"/> 延續案 : <input type="checkbox"/>
標案名稱 :	<input type="text"/>	引用
標案類別 :	<input type="radio"/> (E)工程 <input type="radio"/> (L)勞務 <input type="radio"/> (F)財務 <input type="radio"/> (Z)其他	
	產生檢核點	
標案金額 :	<input type="text"/>	
標案編號 :	<input type="text"/>	
經費編號 :	<input type="text"/>	
標案期程(起) :	<input type="text"/>	標案期程(迄) :
承辦處別 :	國際發展及計畫處	承辦科別 :
承辦人 :	江幸娟	企劃研考科
備註 :	<input type="text"/>	

檢核點管理 進度管制 實支數管理

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁 共 1 筆

◆ 要新增標案前，一定要**先建置計畫**，而且計畫須經國際處審核通過!!

計畫標案管理

新增標案

選取子計畫

填入標案資料

儲存

系統功能列表

計畫標案管理

查詢狀態

查詢

離開

子計畫年度: 113 子計畫序號:

子計畫名稱:

承辦處別: 國際發展及計畫處 承辦科別: 請選擇

承辦人: 請選擇

2

施政計畫

1 2 3 目前在第 1 頁 / 共 3 頁,共 27 筆

選取	子計畫年度	子計畫序號	子計畫名稱	子計畫 期程(起)	子計畫 期程(迄)	承辦處別	承辦科別	承辦人	子計畫 總經費	子計畫 可用經費
<input checked="" type="checkbox"/>	113	CL113000050	臺東縣政府縣民服務中心辦公環境及周邊公共區域清潔業務委外案	1130101	1131231	國際發展及計畫處	公共服務科	林倩玟	516,000	0
<input checked="" type="checkbox"/>	113	CL113000056	114年度施政計畫彙編	1130801	1131231	國際發展及計畫處	企劃研考科	陳慧娟	40,000	40,000
<input checked="" type="checkbox"/>	113	CL113000063	本府113年度重要施政計畫管考	1130101	1131231	國際發展及計畫處	企劃研考科	陳慧娟	0	0

3

- 選取計畫
- 可跨科選取

8

計畫標案管理

新增標案

選取子計畫

填入標案資料

儲存

新增狀態

儲存

離開

子計畫：	114年度施政計畫彙編			選取
子計畫序號：	CL113000056			
計畫期程(起)：	1130801	計畫期程(迄)：	1131231	
計畫總經費：	40000	計畫可用經費(含標案金額)：		

*：[計畫可用經費]內已包含[本標案金額],[標案金額]不得超過[計畫總經費]

標案年度：	<input type="text"/>	產生期程	延續案：	<input type="checkbox"/>
標案名稱：	<input type="text"/>			引用
標案類別：	<input type="radio"/> (E)工程 <input type="radio"/> (L)勞務 <input type="radio"/> (F)財務 <input type="radio"/> (Z)其他			
	<input type="button" value="產生檢核點"/>			
標案金額：	<input type="text"/>			
標案編號：	<input type="text"/>			
經費編號：	<input type="text"/>			
標案期程(起)：	<input type="text"/>	標案期程(迄)：	<input type="text"/>	
承辦處別：	國際發展及計畫處	承辦科別：	企劃研考科	
承辦人：	江幸娟			
備註：	<input type="text"/>			

檢核點管理

進度管制

實支數管理



三、填標案

- 紅字欄位->必填
- 藍字欄位->系統帶入

計畫標案管理

新增標案

選取子計畫

填入標案資料

儲存

新增狀態 儲存 離開

子計畫: 推動臺東縣離島業務加值計畫 選取

子計畫序號: CL113000481

計畫期程(起): 1121201 計畫期程(迄): 1141231

計畫總經費: 750000 計畫可用經費(含標案金額): 1

#: [計畫可用經費]內已包含[本標案金額],[標案金額]不得超過[計畫總經費]

◆ 標案年度：分年度新增標案，所以請填當年度，填完記得按產生期程鈕

標案年度: 114 產生期程

標案名稱: 引用

標案類別: (E)工程 (L)勞務 (F)財務 (Z)其他

產生檢核點

標案金額:

標案編號:

經費編號:

標案期程(起):

承辦處別: 國際發展及計畫處

承辦人: 江幸娟

備註:

2

檢核點管理 進度管制 實支數管理

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 12 筆

年	月	主計系統實支數	主計系統累計實支數
114	01	0	0
114	02	0	0
114	03	0	0

檢核點管理 進度管制 實支數管理

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 12 筆

年	月	主計系統實支數	主計系統累計實支數
114	01	0	0
114	02	0	0
114	03	0	0
114	04	0	0
114	05	0	0
114	06	0	0
114	07	0	0
114	08	0	0
114	09	0	0
114	10	0	0
114	11	0	0
114	12	0	0

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 12 筆

◆ 產生期程：點選後於實支數管理頁籤，就會產生當年度 1~12月的空格，以利對接主計系統每月的實支數

(一)跨年度標案→引用

計畫標案管理

新增標案

選取子計畫

填入標案資料

儲存

系統功能列表 計畫標案管理

新增狀態		儲存	離開
子計畫:	推動臺東縣離島業務加值計畫		選取
子計畫序號:	CL113000481		
計畫期程(起):	1121201	計畫期程(迄):	1141231
計畫總經費:	750000	計畫可用經費(含標案金額):	
# : [計畫可用經費]內已包含[本標案金額],[標案金額]不得超過[計畫總經費]			
標案年度:	114	產生期程	延續案: <input type="checkbox"/>
標案名稱:	推動臺東縣離島業務加值計畫-委辦費	引用	
標案類別:	<input type="radio"/> (E)工程 <input type="radio"/> (L)勞務 <input type="radio"/> (F)財務 <input type="radio"/> (Z)其他		
	產生檢核點		
標案金額:			
標案編號:	1131101L0004		
經費編號:			
標案期程(起):	1130101	標案期程(迄):	1141231
承辦處別:	國際發展及計畫處	承辦科別:	企劃研考科
承辦人:	江幸娟		
備註:			
<input checked="" type="checkbox"/> 檢核點管理	<input type="checkbox"/> 進度管制	<input type="checkbox"/> 實支數管理	

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁 共 1 筆

執行期程2年(含)以上之標案，請記得點選「引用」按鈕，可以引用舊的標案資料，並勾選「延續案」

◆ 標案名稱：如為跨年度延續的標案，可以直接點選「引用」，系統會帶入前一年度已經建置的標案名稱、標案編號及標案期程

計畫標案管理

新增標案

選取子計畫

填入標案資料

儲存

引用之後的畫面

標案編號：	1131101L0004		
經費編號：	1141101L0001		
標案期程(起)：	1130101	標案期程(迄)：	1141231
承辦處別：	國際發展及計畫處	承辦科別：	企劃研考科
承辦人：	江幸娟		
決標日期：			
承包商：			
備註：			

◆ 標案編號與113年已建置之標案編號相同，但是經費編號會依照新增年度取號

檢核點管理 進度管制 實支數管理

目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 6 筆

序號	檢核點?	檢核點	進度	預定完成日	實際完成日
1	L101	招標文件核定	25%	1130101	
2	L102	決標	40%	1130301	
3	L103	合約簽訂	55%	1130501	
4	L104	期初報告完成	75%	1130930	
5	L105	期末報告完成	95%	1141001	
6	L106	驗收完成	100%	1141215	

◆ 檢核點管理：請填報預定完成日期，並請依照標案總期程填列

(二)1年期標案→直接填寫

執行期程1年之標案

計畫標案管理

新增標案

選取子計畫

填入標案資料

儲存

新增狀態 儲存 離開

子計畫：114年度施政計畫彙編

子計畫序號：CL113000056

計畫期程(起)：1130801 計畫期程(迄)：1131231

計畫總經費：40000 計畫可用經費(含標案金額)：0

#：[計畫可用經費]內已包含[本標案金額],[標案金額]不得超過[計畫總經費]

標案年度：114 產生期程 延續案

標案名稱：test

標案類別： (E)工程 (L)勞務 (F)財務 (Z)其他

標案金額：40000

標案編號：1141101Z0001

經費編號：1141101Z0001

標案期程(起)：1140501 標案期程(迄)：1141110

承辦處別：國際發展及計畫處 承辦科別：企劃科

承辦人：江幸娟

備註：

檢核點管理 進度管制 實支數管理

◆ 標案名稱：新增當年度的標案名稱

◆ 標案期程及檢核點管理：請依照契約期程填寫

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 6 筆

序號	檢核點	檢核點	進度	預定完成日	實際完成日
1	Z101	年度經費達成率達25	25%	1140509	
2	Z102	年度經費達成率達40	40%	1140620	
3	Z103	年度經費達成率達55	55%	1140710	
4	Z104	年度經費達成率達75	75%	1140820	
5	Z105	年度經費達成率達95	95%	1141010	
6	Z106	年度經費達成率達10	100%	1141109	

(三)標案類別

計畫標案管理

新增標案

選取子計畫

填入標案資料

儲存

標案名稱：	test		
標案類別：	<input type="radio"/> (E)工程 <input type="radio"/> (L)勞務 <input type="radio"/> (F)財務 <input checked="" type="radio"/> (Z)其他		
	產生檢核點		
標案金額：	40000		
標案編號：	1141101Z0001		
經費編號：	1141101Z0001		
標案期程(起)：	1140501	標案期程(迄)：	1141110
承辦處別：	國際發展及計畫處	承辦科別：	企劃研考科
承辦人：	江幸娟		
備註：			
<input checked="" type="checkbox"/> 檢核點管理 <input type="checkbox"/> 進度管制 <input type="checkbox"/> 實支數管理			

◆ 標案類別：選擇符合的類別之後，點選「產生檢核點」按鈕，於下方“檢核點管理”的頁籤即會產生相對應的檢核點內容

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 6 筆

序號	檢核點	檢核點	進度	預定完成日	實際完成日
1	Z101	年度經費達成率達25	25%	1140509	
2	Z102	年度經費達成率達40	40%	1140620	

計畫標案管理

新增標案

選取子計畫

填入標案資料

儲存

(E)
工程

<input checked="" type="checkbox"/> 檢核點管理 <input type="checkbox"/> 進度管制 <input type="checkbox"/> 實支數管理				
1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 6 筆				
序號	檢核點	進度	預定完成日	實際完成日
1	工程核定	25%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	決標	40%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	開工	55%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	施工進度達50%	75%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	完工	95%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	驗收完成	100%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 6 筆				

(L)
勞務

<input checked="" type="checkbox"/> 檢核點管理 <input type="checkbox"/> 進度管制 <input type="checkbox"/> 實支數管理				
1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 6 筆				
序號	檢核點	進度	預定完成日	實際完成日
1	招標文件核定	25%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	決標	40%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	合約簽訂	55%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	期初報告完成	75%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	期末報告完成	95%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	驗收完成	100%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 6 筆				

(F)
財物

<input checked="" type="checkbox"/> 檢核點管理 <input type="checkbox"/> 進度管制 <input type="checkbox"/> 實支數管理				
1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 6 筆				
序號	檢核點	進度	預定完成日	實際完成日
1	規格簽准	25%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	招標	40%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	決標	55%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	第一批交貨	75%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	交貨完成	95%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	驗收完成	100%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 6 筆				

(Z)
其他

<input checked="" type="checkbox"/> 檢核點管理 <input type="checkbox"/> 進度管制 <input type="checkbox"/> 實支數管理				
1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 6 筆				
序號	檢核點	進度	預定完成日	實際完成日
1	年度經費達成率達25%	25%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	年度經費達成率達40%	40%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	年度經費達成率達55%	55%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	年度經費達成率達75%	75%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	年度經費達成率達95%	95%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	年度經費達成率達100%	100%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 6 筆				

◆ 自辦案請選“其他”

(四)標案金額

新增狀態		儲存	離開
子計畫：	114年度施政計畫彙編		
子計畫序號：	CL113000056		
計畫期程(起)：	1130801	計畫期程(迄)：	1131231
計畫總經費：	40000	計畫可用經費(含標案金額)：	
：[計畫可用經費]內已包含[本標案金額],[標案金額]不得超過[計畫總經費]			
標案年度：	114	產生期程	延續案： <input type="checkbox"/>
標案名稱：	test		
標案類別：	<input type="radio"/> (E)工程 <input type="radio"/> (L)勞務 <input type="radio"/> (F)財務 <input checked="" type="radio"/> (Z)其他 產生檢核點		
標案金額：	40000		
標案編號：	1141101Z0001		
經費編號：	1141101Z0001		
標案期程(起)：	1140501	標案期程(迄)：	1141110
承辦處別：	國際發展及計畫處	承辦科別：	企劃研考科
承辦人：	江幸娟		
備註：			

- 標案金額是填當年度之預算，而不是決標金額
- 標案金額不能超過計畫總經費

如經費來源有2項(含)以上

◆ 備註欄：請選取經費較多的來源計畫當子計畫，並在備註欄敘明標案總經費

計畫標案管理

新增標案

選取子計畫

填入標案資料

儲存

新增狀態

子計畫： 114年度施政計畫彙編

子計畫序號： CL113000056

計畫期程(起)： 1130801 計畫期程(迄)： 1131231

計畫總經費： 40000 計畫可用經費(含標案金額)： 0

[計畫可用經費]內已包含[本標案金額],[標案金額]不得超過[計畫總經費]

標案年度： 114 延續案：

標案名稱： test

標案類別： (E)工程 (L)勞務 (F)財務 (Z)其他

標案金額： 40000

標案編號： 1141101Z0001

經費編號： 1141101Z0001

標案期程(起)： 1140501 標案期程(迄)： 1141110

承辦處別： 國際發展及計畫處 承辦科別： 企劃研考科

承辦人： 江幸娟

備註：

填報完畢，點選儲存按鈕

標案列表

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆

內容	編輯	刪除	年度	標案編號	標案名稱	計畫名稱	承辦處別	承辦科別	承辦人	計畫期程(起)	計畫期程(迄)	標案類別	主計系統累計宣支數	標案金額	標案進度(%)
內容	編輯	刪除	114	1141101Z0001	test	114年度施政計畫彙編	國際發展及計畫處	企劃研考科	江幸娟	1140501	1141110	Z	0	40,000	0

1 目前在第 1 頁 / 共 1 頁,共 1 筆

看到這個畫面，就是填報完成了!!

➤ 標案系統怎麼填？

◆ 案例1：跨年度標案、執行期程2年(113~114年)、總經費500萬(113年預算編列300萬、114年預算編列200萬)

● 標案年度：114年

標案年度:	<input type="text"/>	產生期程	延續案: <input checked="" type="checkbox"/>
標案名稱:	<input type="text"/>		<input type="button" value="引用"/>

● 延續案：請”打勾”

● 標案名稱：點選「引用」按鈕，選取113年已建置完成之標案

● 標案經費：200萬(填114年的預算數，而且是填「預算金額」，不是填決標金額)

● 標案期程：113.1.1~114.12.31(依照實際標案進度填報)

➤ 標案系統怎麼填？

◆ 案例2：多筆經費來源之標案，標案總經費300萬元，A預算科目支應200萬、B預算科目支應100萬

- 標案名稱：000採購案
- 標案年度：114年
- 標案金額：200萬(選擇經費較多的子計畫，並且填寫該子計畫支應的預算數額，請不要多填，以免佔用其他人的額度，請填預算金額，不是決標金額!!)
- 備註欄：此案標案總經費300萬元，其中200萬元由A計畫支應、100萬元B計畫支應(一定要記得寫!!)

子計畫：	<input type="text"/>	選取
------	----------------------	----

標案金額：	<input type="text"/>		
標案編號：	<input type="text"/>		
經費編號：	<input type="text"/>		
標案期程(起)：	<input type="text"/>	標案期程(迄)：	<input type="text"/>
承辦處別：	國際發展及計畫處	承辦科別：	企劃研考科
承辦人：	江幸娟		
備註：	<input type="text"/>		

簡報完畢

感謝聆聽

